Fotodokumentation

Musterprojekt · EG · Aufmaß Nr. 1

Bauvorhaben	**Musterprojekt – Neubau Bürogebäude, EG**
Auftraggeber	**Muster Bauherr GmbH**
Auftragnehmer	**Musterfirma GmbH – Malerarbeiten**
Bezug	**Aufmaßplan Nr. 1 · Abschlagsrechnung Nr. 1**

Fotostandorte im Aufmaßplan

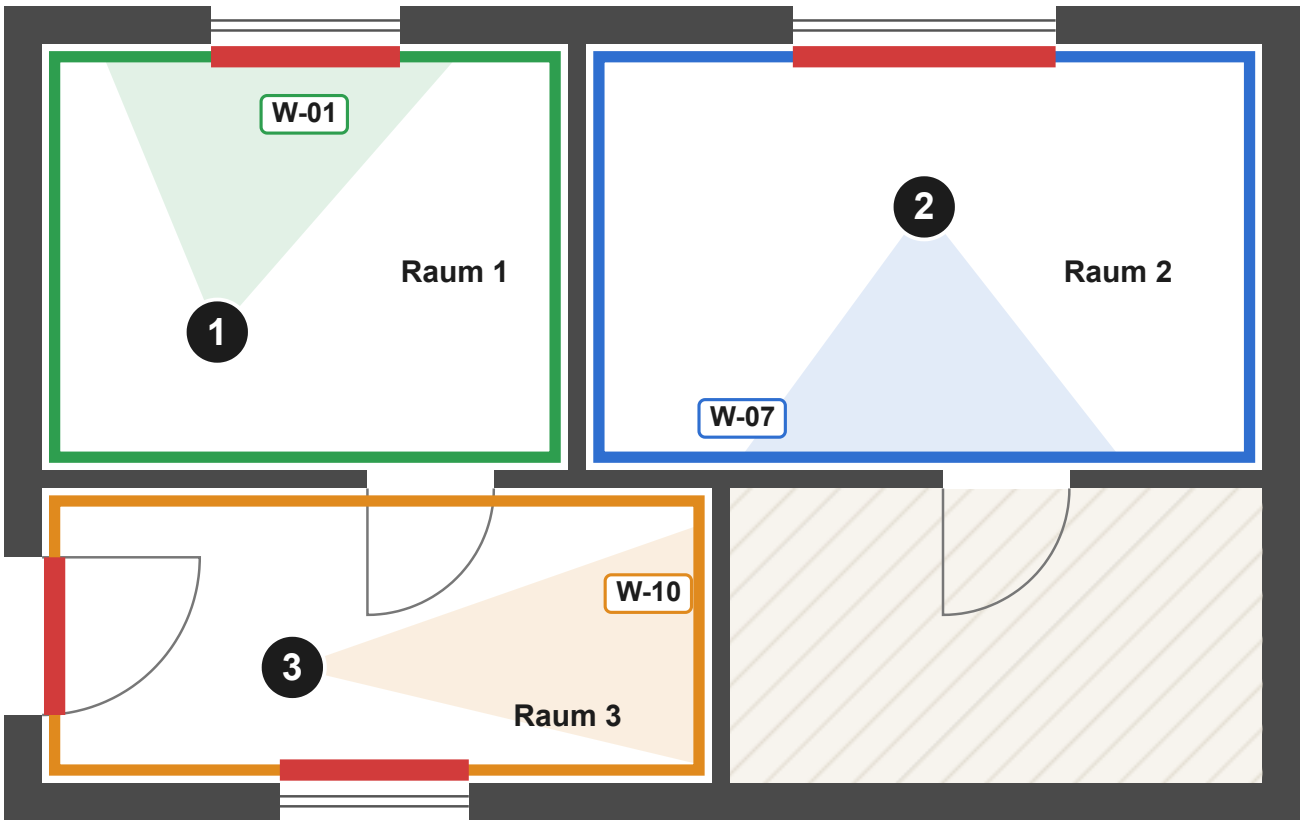

● Standort mit Fotonummer Blickrichtung Abzug (Öffnung über 2,5 m²)

Fotoliste

Nr.	Datum	Wand	Pos.	Raum	Blick	Bemerkung zum Leistungsstand
1	20.11.2026	W-01	01	Raum 1	Nord	Fensteröffnung 1,51 × 1,76 m = 2,66 m² – über 2,5 m², daher als Abzug gerechnet.
2	06.11.2026	W-07	02	Raum 2	Süd	Zwischenstand vor der Beplankung: Türöffnung 1,01 × 2,13 m = 2,15 m² – bis 2,5 m², daher übermessen.
3	20.11.2026	W-10	03	Raum 3	Ost	Wandfläche ohne Öffnung, 2,35 × 2,45 m = 5,76 m² – voll gerechnet.



Foto	**1**	Datum	20.11.2026	Wand	**W-01**	Pos.	01
Standort	Raum 1, Standort 1 im Plan			Blick	Nord		
Bemerkung	Fensteröffnung 1,51 × 1,76 m = 2,66 m² – über 2,5 m², daher als Abzug gerechnet.						



Foto	**2**	Datum	06.11.2026	Wand	**W-07**	Pos.	02
Standort	Raum 2, Standort 2 im Plan			Blick	Süd		
Bemerkung	Zwischenstand vor der Beplankung: Türöffnung 1,01 × 2,13 m = 2,15 m² – bis 2,5 m², daher übermessen.						



Foto	**3**	Datum	20.11.2026	Wand	**W-10**	Pos.	03
Standort	Raum 3, Standort 3 im Plan			Blick	Ost		
Bemerkung	Wandfläche ohne Öffnung, 2,35 × 2,45 m = 5,76 m² – voll gerechnet.						

Hinweis

Jedes Foto ist einer Wand, einer Position und einem Standort im Aufmaßplan zugeordnet. So lässt sich jede Menge im Excel-Aufmaß auf der Baustelle und im Plan nachvollziehen.

Aufgestellt (Datum, Unterschrift)

Gesehen / anerkannt – Auftraggeber
